



RSD MANGUSADA



CV. MANAR JAYA

Jl. Nuansa Hijau Utama III/10 Ubung Kaja Denpasar Utara 80116,
Telp./Fax: (0361) 412843, E-mail: armitajaya@yahoo.co.id

• NPWP: 02.079.796.5-901.000 • KTA: 11076/P/0115/7/BL • REK: 050.01.11.00023-0 • Hp: 081.240.96428

Om, Swastiastu

Berikut Penyampaian Informasi Progres

Pekerjaan	:	
Minggu ke	:	I
Tanggal	:	12 SEPTEMBER S.D 18 SEPTEMBER 2023
Rencana	:	0.117
Realisasi	:	0.312
Deviasi	:	0.195
Waktu Terpakai	:	7
Sisa Waktu	:	83

Lingkup Pekerjaan Pencapaian

3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
3.1	APK
a	Pembatas Area (Restricted Area)
3.2	APD
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)
b	Pelindung pernafasan dan mulut (Masker, Masker Respirator)
c	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)
d	Rompi keselamatan (Safety vest)

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Om, Santhi, Santhi, Santhi, Om



RSD MANGUSADA



CV. MANAR JAYA

Jl. Nuansa Hijau Utama III/10 Ubung Kaja Denpasar Utara 80116,
Telp./Fax: (0361) 412843, E-mail: armitajaya@yahoo.co.id

• NPWP: 02.079.796.9.901.000 • KTA: 11070/P/0157/BL • REK: 050.01.11.00023-0 • Hp: 081 246 96428

Om, Swastiastu

Berikut Penyampaian Informasi Progres

Pekerjaan	:	
Minggu ke	:	2
Tanggal	:	19 September s.d 25 September 2023
Rencana	:	0.336
Realisasi	:	0.402
Deviasi	:	0.066
Waktu Terpakai	:	14
Sisa Waktu	:	76

Lingkup Pekerjaan Pencapaian

3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
3.1	APK
a	Pembatas Area (Restricted Area)
3.2	APD
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)
b	Pelindung pernafasan dan mulut (Masker, Masker Respirator)
c	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)
d	Rompi keselamatan (Safety vest)

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Om, Santhi, Santhi, Santhi, Om

PROGRES REPORT PENGAWASAN MINGGU 2 (19 SEPTEMBER S.D 25 SEPTEMBER 2023)

DATA KEGIATAN
 SATHK/KEGIATAN : Kegiatan Pemataan Landscape Gedung Baru Rumah Sakit Riba Tahun Anggaran 2023
 PEKERJAAN : Pengawasan Pengadaan Jalan Khusus, Pemataan Landscape (Parkir)
 NILAI PROYEK : Rp. 979.725.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu Rupiah)
 WAKTU PELAKSANAAN : 20 (Sembilan Puluh Hari)
 KONTRAKTOR : PT. MANIK SEKECAP KARYA
 KONSULTAN PENGAWAS : CV. MANAR JAYA

TANGGAL	LAPORAN CUACA		
	CERAH	MENDUNG	HUJAN
19	✓		
20	✓		
21	✓		
22	✓		
23	✓		
24	✓		
25	✓		

KENDALA DALAM PEKERJAAN
 1. Terlambatnya persiapan tenaga galian tanah
 2. Belum kelainan pekerjaan Galian

SATUAN PEKERJAAN	
NO	SUB PEKERJAAN
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
3.1	APK
a	Pembatas Area (Restricted Area)
3.2	APD
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)
b	Pelindung pernafasan dan mulut (Masker, Masker Respirator)
c	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)
d	Rompi keselamatan (Safety vest)




SOLUSI PERMASALAHAN
 1. Proses Approval sudah berlangsung mohon setorkan bukti Invoice pemesanan pekerjaan Saluran U-ditch

TENAGA KERJA DI LAPANGAN PER MINGGU


NO	URAIAN	19	20	21	22	23	24	25
1	Pelaksana	2	2	2	2	2	2	2
2	Ahli K3	1	1	1	1	1	1	1
3	Mandor	1	1	1	1	1	1	1
4	Kepala Tukang							
5	Tukang Batu							
6	Tukang Aluminium							
7	Tukang Listrik							
8	Tukang Plafond							
9	Pekerja	2	2	2	2	2	2	2
JUMLAH		6	6	6	6	6	6	6

KETERANGAN

- Proses Approval sudah berlangsung mohon setorkan bukti Invoice pemesanan pekerjaan Saluran U-ditch
- Minggu Ketiga sudah berlangsungnya pekerjaan Galian

DIBUAT OLEH
 KONSULTAN PENGAWAS
CV. MANAR JAYA

 I Dewa Nyoman Karyawan, ST
 Team Leader

NO	URAIAN	19	20	21	22	23	24	25
1	Pelaksana	2	2	2	2	2	2	2
2	Ahli K3	1	1	1	1	1	1	1
3	Mandor	1	1	1	1	1	1	1
4	Kepala Tukang							
5	Tukang Batu							
6	Tukang Aluminium							
7	Tukang Listrik							
8	Tukang Plafond							
9	Pekerja	2	2	2	2	2	2	2
JUMLAH		6	6	6	6	6	6	6



CV. MANAR JAYA
 Jl. Nuansa Hijau Utama III/10 Ubung Kaja Denpasar Utara 80116,
 Telp./Fax: (0361) 412843, E-mail: amritajaya@yahoo.co.id

DOKUMENTASI PROGRES

PEKERJAAN KELENGKAPAN K3 - ON SITE LAPANGAN



PENGUKURAN SITE LAPANGAN ELEVASI TAHAP 1




PROGRES REPORT PENGAWASAN MINGGU 3 (26 SEPTEMBER S.D 02 OKTOBER 2023)

DATA KEGIATAN
 BATKER/KEGIATAN : Kegiatan Penataan Landscape Gedung Baru Rumah Sakit Rbs Tahun Anggaran 2023
 PEKERJAAN : Pengawasan Pengadaan Jalan Khusus, Penataan Landscape (Perker)
 NILAI PROYEK : Rp. 979.725.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu Rupiah)
 WAKTU PELAKSANAAN : 90 (Sembilan Puluh Hari)
 KONTRAKTOR : PT. MANIK SEKECAP KARYA
 KONSULTAN PENGAWAS : CV. MANAR JAYA

TANGGAL	LAPORAN CUACA		
	CERAH	MENDUNG	HUJAN
26	√		
27	√		
28	√		
29	√		
30	√		
1	√		
2	√		

KENDALA DALAM PEKERJAAN
 1. Terlambatnya persiapan tenaga kerja tanah
 2. Belum Kesiapan pekerjaan Galikan


SATUAN PEKERJAAN	
NO	SUB PEKERJAAN
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
3.1	APK
a	Pembatas Area (Restricted Area)
3.2	APD
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)
b	Pelindung pernafasan dan mulut (Masker, Masker Respirator)
c	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)
d	Rompi keselamatan (Safety vest)

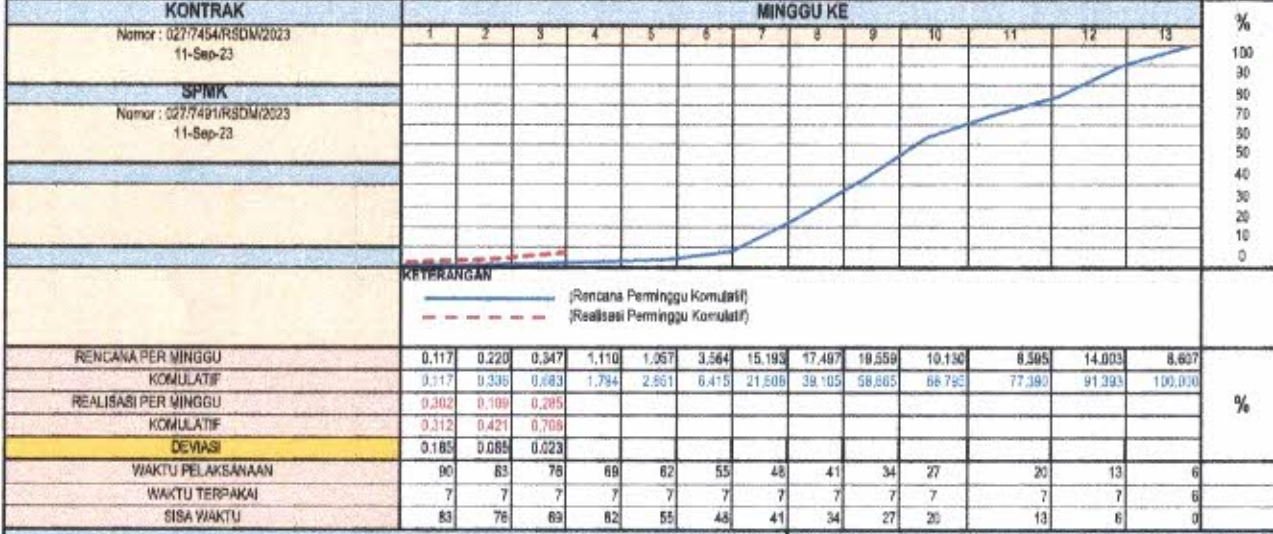

SOLUSI/PERMASALAHAN
 1. Proses Aproval sudah berlangsung mohon satukan bukti Invoice pemesanan pekerjaan Sekuran U-dich







TENAGA KERJA DI LAPANGAN PER MINGGU													

KETERANGAN
 1. Proses Aproval sudah berlangsung mohon satukan bukti Invoice pemesanan pekerjaan Sekuran U-dich
 2. Minggu Ketiga sudah berlangsungnya pekerjaan Galikan

DIBUAT OLEH
 KONSULTAN PENGAWAS
CV. MANAR JAYA

 I Dewa Nyantha Karayana, ST
 Team Leader

NO	URAIAN	26	27	28	29	30	1	2
1	Pelaksana	2	2	2	2	2	2	2
2	Ahli K3	1	1	1	1	1	1	1
3	Mandor	1	1	1	1	1	1	1
4	Kapala Tukang							
5	Tukang Batu							
6	Tukang Aluminium							
7	Tukang Listrik							
8	Tukang Plafond							
9	Pekerja	2	2	2	2	2	2	2
JUMLAH		6	6	6	6	6	6	6

DOKUMENTASI PROGRES

RAPAT MINGGUAN MINGGU KE - 3	PENGUKURAN SITE LAPANGAN ELEVASI	PENGALIHAN TITIK ELEVASI YANG DI SEPAKATI
		
		



RSD MANGUSADA



CV. MANAR JAYA

Jl. Nuansa Hijau Utama III/10 Ubung Kaja Denpasar Utara 80116,
Telp./Fax: (0361) 412843, E-mail: armitajaya@yahoo.co.id

• NPWP: 02.070.796.5-901.000 • KTA: 11070/P/0157/BL • REK: 050.01.11.00023-0 • Hp: 081 248 98428

Om, Swastiastu

Berikut Penyampaian Informasi Progres

Pekerjaan	:	
Minggu ke	:	4
Tanggal	:	03 OKTOBER S.D 09 OKTOBER 2023
Rencana	:	1.794
Realisasi	:	2.412
Deviasi	:	0.618
Waktu Terpakai	:	28
Sisa Waktu	:	62

Lingkup Pekerjaan Pencapaian

	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
3.1	APK
a	Pembatas Area (Restricted Area)
3.2	APD
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)
b	Pelindung pernafasan dan mulut (Masker, Masker Respirator)
c	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)
d	Rompi keselamatan (Safety vest)
II	DIVISI 2. DRAINASE
a	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Om, Santhi, Santhi, Santhi, Om



RSD MANGUSADA



CV. MANAR JAYA

Jl. Nuansa Hijau Utama III/10 Ubung Kaja Denpasar Utara 80116,
Telp./Fax: (0381) 412843, E-mail: armitajaya@yahoo.co.id

• NPWP: 02.079.706.5-901.000 • KTA: 11070/P/0157.BL • REK: 050.01.11.00023-0 • Hp: 081 246 96426

Om, Swastiastu

Berikut Penyampaian Informasi Progres

Pekerjaan	:	
Minggu ke	:	5
Tanggal	:	(10 OKTOBER S.D 16 OKTOBER 2023)
Rencana	:	2.851
Realisasi	:	3.243
Deviasi	:	0.392
Waktu Terpakai	:	35
Sisa Waktu	:	55

Lingkup Pekerjaan Pencapaian

	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
3.1	APK
a	Pembatas Area (Restricted Area)
3.2	APD
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)
b	Pelindung pernafasan dan mulut (Masker, Masker Respirator)
c	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)
d	Rompi keselamatan (Safety vest)
II	DIVISI 2. DRAINASE
a	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkann terima kasih

Om, Santhi, Santhi, Santhi, Om

PROGRES REPORT PENGAWASAN MINGGU 5 (10 OKTOBER S.D 16 OKTOBER 2023)

DATA KEGIATAN

SATYERKEGIATAN : Kegiatan Penataan Landscape Gedung Baru Rumah Sakit Rba Tahun Anggaran 2023
 PEKERJAAN : Pangeasian Pengadaan Jalan Khusus, Penataan Landscape (Parkir)
 NILAI PROYEK : Rp. 979.725.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu Rupiah)
 WAKTU PELAKSANAAN : 90 (Sembilan Puluh Hari)
 KONTRAKTOR : PT. BANK SEKECAP KARYA
 KONSULTAN PENGAWAS : CV. MANAR JAYA

LAPORAN CUACA

TANGGAL	CERAH	MENDUNG	HUJAN
10	√		
11	√		
12	√		
13	√		
14	√		
15	√		
16	√		

KENDALA DALAM PEKERJAAN

BATUAN PEKERJAAN

NO	SUB PEKERJAAN
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
3.1	APK
a	Pembatas Area (Restricted Area)
3.2	APD
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)
b	Pelindung pernafasan dan mulut (Masker, Masker Respirator)
c	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)
d	Rompi keselamatan (Safety vest)


KONTRAK

Nomer : 0277454/RSDM/2023
11-Sep-23

SPMK

Nomer : 0277491/RSDM/2023
11-Sep-23

MINGGU KE

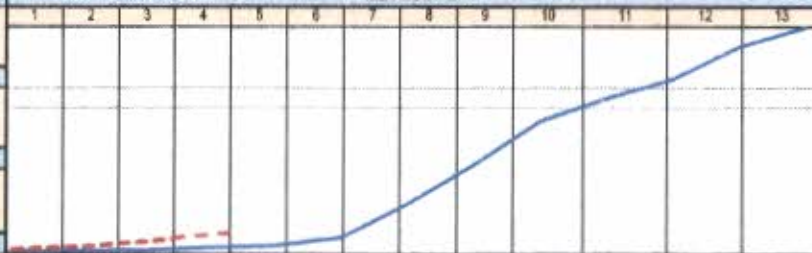

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

SOLUSI PERMASALAHAN

1. segera melakukan pekerjaan galian
2. Hati-hati dalam pekerjaan galian untuk adanya pipa bawah di lapangan

DIVISI 2. DRAINASE
a Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air

KETERANGAN

— (Rencana Peninggu Kumulatif)
- - - (Realisasi Peninggu Kumulatif)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RENCANA PER MINGGU	0,117	0,220	0,347	1,110	1,057	3,564	15,193	17,487	19,569	10,130	8,590	14,003	8,607
KOMULATIF	0,117	0,336	0,683	1,794	2,851	6,415	21,608	39,105	58,675	68,793	77,382	91,383	100,000
REALISASI PER MINGGU	0,302	0,109	0,285	1,725	0,812								
KOMULATIF	0,312	0,421	0,706	2,431	3,243								
DEVIASI	0,185	0,385	0,023	0,837	0,382								
WAKTU PELAKSANAAN	90	83	76	69	62	55	48	41	34	27	20	13	6
WAKTU TERPAKAI	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6
SISA WAKTU	83	76	69	62	55	48	41	34	27	20	13	6	0

DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
CV. MANAR JAYA

[Signature]
I Dewa Noman Karwan, ST
Team Leader

TENAGA KERJA DI LAPANGAN PER MINGGU

- KETERANGAN
1. Proses Aproval sudah berlangsung mohon selorkan bukti Invoice pemesanan pekerjaan Saluran U-ditch
 2. Konfirmasi Untuk Jadwal Kedatangan U-Ditch

DOKUMENTASI PROGRES

NO	URAIAN	10	11	12	13	14	15	16
1	Petaka	2	2	2	2	2	2	2
2	Ani KG	1	1	1	1	1	1	1
3	Mandor	1	1	1	1	1	1	1
4	Kepala Tukang							
5	Tukang Batu							
6	Tukang Alumnium							
7	Tukang Listrik							
8	Tukang Plafond							
9	Pekerja	4	4	4	4	4	4	4
JUMAH		8	8	8	8	8	8	8



M CV. MANAR JAYA
 Jl. Nuansa Hijau Utama III/10 Ubung Kaje Denpasar Utara 80116,
 Telp./Fax: (0361) 412843, E-mail: amanjaya@yahoo.co.id



RSD MANGUSADA



CV. MANAR JAYA

Jl. Nuansa Hijau Utama III/10 Ubung Kaja Denpasar Utara 80116,
Telp./Fax: (0361) 412843, E-mail: armitajaya@yahoo.co.id

• NPWP: 02.079.796.5-931.000 • KTA: 11070/P/0167/BL • REK: 050.01.11.00023-0 • Hp: 081 246 96429

Om, Swastiastu

Berikut Penyampaian Informasi Progres

Pekerjaan	:	
Minggu ke	:	6
Tanggal	:	(17 OKTOBER S.D 23 OKTOBER 2023)
Rencana	:	6.415
Realisasi	:	7.385
Deviasi	:	0.970
Waktu Terpakai	:	42
Sisa Waktu	:	48

Lingkup Pekerjaan Pencapaian

	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
3.1	APK
a	Pembatas Area (Restricted Area)
3.2	APD
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)
b	Pelindung pernafasan dan mulut (Masker, Masker Respirator)
c	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)
d	Rompi keselamatan (Safety vest)
II	DIVISI 2. DRAINASE
a	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Om, Santhi, Santhi, Santhi, Om



RSD MANGUSADA



CV. MANAR JAYA

Jl. Nuansa Hijau Utama III/10 Ubung Kaja Denpasar Utara 80116.
Telp./Fax: (0361) 412843, E-mail: armitajaya@yahoo.co.id

• NPWP: 02-079.796.5-901.000 • KTA: 11070/PD167/BL • REK: 056.01.11.00023-0 • Hp: 081 246 90428

wastiastu

Informasi Progres

Perkiraan pekerjaan	:	
Waktu hingga ke	:	7
Perkiraan tanggal	:	(24 OKTOBER S.D 30 OKTOBER 2023)
Perkiraan rencana	:	21.608
Realisasi	:	23.075
Deviasi	:	1.467
Manusia Terpakai	:	49
Biaya Waktu	:	41

Pencapaian

Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	
3.1	APK
a	Pembatas Area (Restricted Area)
3.2	APD
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)
b	Pelindung pernafasan dan mulut (Masker, Masker Respirator)
c	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)
d	Rompi keselamatan (Safety vest)
II	DIVISI 2. DRAINASE
1	Galian untuk selokan drainase dan saluran air
2	Saluran berbentuk U tipe 50x60x120 cm (dengan tutup pracetak tipe tutup CU 50x10x120 cm), T = 10 ton
3	Saluran berbentuk U tipe 30.40.120.8 cm (dengan tutup grill besi)
4	Box Culvert 60/60/120 (Precast pabriksi)

atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Om, Santhi, Santhi, Santhi, Om



RSD MANGUSADA



CV. MANAR JAYA

Jl. Nuansa Hijau Utama III/10 Ubung Kaja Denpasar Utara 80116,
Telp./Fax: (0361) 412843, E-mail: armitajaya@yahoo.co.id

• NPWP: 02.079.796.5-001.000 • NTA: 11070/P10107.0L • BEK: 050.01.11.00023-0 • Hp: 081.246.96428

wastiastu

ajian Informasi Progres

kerjaan :	
inggu ke :	8
anggal :	31 OKTOBER S.D 06 NOVEMBER 2023
encana :	39.105
realisasi :	39.294
eviasi :	0.188
u Terpakai :	56
a Waktu :	34

erjaan Pencapaian

	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
3.1	APK
a	Pembatas Area (Restricted Area)
3.2	APD
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)
b	Pelindung pernafasan dan mulut (Masker, Masker Respirator)
c	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)
d	Rompi keselamatan (Safety vest)
II	DIVISI 2. DRAINASE
1	Galian untuk selokan drainase dan saluran air
2	Saluran berbentuk U tipe 50x60x120 cm (dengan tutup pracetak tipe tutup CU 50x10x120 cm), T = 10 ton
3	Saluran berbentuk U tipe 30.40.120.8 cm (dengan tutup grill besi)
4	Box Culvert 60/60/120 (Precast pabrikasi)

atas perhatiannya kami ucapkann terima kasih

Om, Santhi, Santhi, Santhi, Om

PROGRES REPORT PENGAWASAN MINGGU 8 (31 OKTOBER S.D 06 NOVEMBER 2023)


KEGIATAN : Kegiatan Penataan Landscape Gedung Baru Rumah Sakti Riba Tahun Anggaran 2023
PEKERJAAN : Pengawasan Pengadean Jalan Khusus, Penataan Landscape (Parkir)
AI PROYEK : Rp. 979.725.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu Rupiah)
PELAKSANAAN : 90 (Sembilan Puluh Hari)
NYTRAKTOR : PT. MANIK SEKECAP KARYA
TAN PENGAWAS : CV. MANAR JAYA

LAPORAN CUACA			
TANGGAL	CERAH	MERCUNG	BUJAN
31	√		
1	√		
2	√		
3	√		
4	√		
5	√		
6	√		


KENDALA DALAM PEKERJAAN

SOLUSI PERMASALAHAN

- segera melakukan pekerjaan galian
- hati hati dalam pekerjaan galian untuk adanya pipa existing di lapangan
- Perhatikan Pekerjaan Pemotongan Aspal

DIBUAT OLEH
 KONSULTAN PENGAWAS
CV. MANAR JAYA

 I Dewa Niema Karyawan, ST
 Team Leader

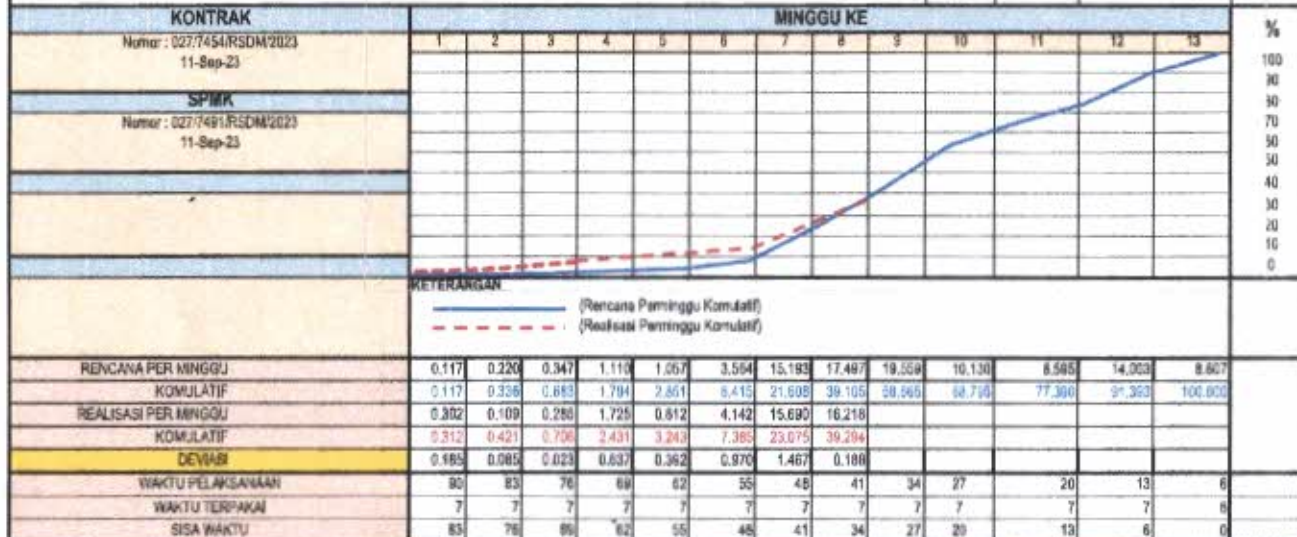SATUAN PEKERJAAN	
NO	SUB PEKERJAAN
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
3.1	APK
a	Pembatas Area (Restricted Area)
3.2	APD
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)
b	Pelindung pernafasan dan mulut (Masker, Masker Respirator)
c	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)
d	Rongpl keselamatan (Safety vest)
4	DIVISI 2. DRAINASE
4	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air



TENAGA KERJA DI LAPANGAN PER MINGGU

KETERANGAN

- Proses Aproval sudah berlangsung mohon setorkan bukti Invoice pemesanan pekerjaan Saluran U-ditch
- Konfirmasi Untuk Jadwal Kedatangan U-Ditch

NO	URAIAN	31	1	2	3	4	5	6
1	Pelaksana	2	2	2	2	2	2	2
2	Ahli IC	1	1	1	1	1	1	1
3	Mandor	1	1	1	1	1	1	1
4	Kepala Tukang							
5	Tukang Batu							
6	Tukang Aluminium							
7	Tukang Listrik							
8	Tukang Plafond							
9	Peternja	4	4	4	4	4	4	4
JUMDAH		8	8	8	8	8	8	8

DOKUMENTASI PROGRES





RSD MANGUSADA



CV. MANAR JAYA

Jl. Nuansa Hijau Utama 88/10 Ubung Kaja Denpasar Utara 80116,
Telp./Fax: (0361) 412843, E-mail: amritajaya@yahoo.co.id

• NPWP: 02.079.796.5-901.000 • KTA: 11070/P/0137/B • REK: 050.01.11.000234 • Tlp: 081.240.96428

Om, Swastiastu

Berikut Penyampaian Informasi Progres

Pekerjaan	:	
Minggu ke	:	9
Tanggal	:	07 NOVEMBER S.D 13 NOVEMBER 2023
Rencana	:	58.665
Realisasi	:	58.708
Deviasi	:	0,044
Waktu Terpakai	:	63
Sisa Waktu	:	27

Lingkup Pekerjaan Pencapaian

	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
3.1	APK
a	Pembatas Area (Restricted Area)
3.2	APD
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)
b	Pelindung pernafasan dan mulut (Masker, Masker Respirator)
c	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)
d	Rompi keselamatan (Safety vest)
II	DIVISI 2. DRAINASE
1	Galian untuk selokan drainase dan saluran air
2	Saluran berbentuk U tipe 50x60x120 cm (dengan tutup pracetak tipe tutup CU 50x10x120 cm), T = 10 ton
3	Saluran berbentuk U tipe 30.40.120.8 cm (dengan tutup grill besi)
4	Box Culvert 60/60/120 (Precast pabrikasi)

atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Om, Santhi, Santhi, Santhi, Om



RSD MANGUSADA



CV. MANAR JAYA

Jl. Nuansa Hijau Utama III/10 Ubung Kaja Denpasar Utara 80116,
Telp./Fax: (0361) 412043, E-mail: amanjaya@yahoo.co.id

• NPWP: 02.079.796.5-901.000 • NTA: 110719/P/0157/IL • NIK: 590.01.11.80251.0 • Hp: 081 240 96428

Om, Swastiastu

Berikut Penyampaian Informasi Progres

Pekerjaan	:	
Minggu ke	:	10
Tanggal	:	14 NOVEMBER S.D 20 NOVEMBER 2023
Rencana	:	58.665
Realisasi	:	58.708
Deviasi	:	0.044
Waktu Terpakai	:	70
Sisa Waktu	:	20

Lingkup Pekerjaan Pencapaian


	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
3.1	APK
a	Pembatas Area (Restricted Area)
3.2	APD
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)
b	Pelindung pernafasan dan mulut (Masker, Masker Respirator)
c	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)
d	Rompi keselamatan (Safety vest)
II	DIVISI 2. DRAINASE
1	Galian untuk selokan drainase dan saluran air
2	Saluran berbentuk U tipe 50x60x120 cm (dengan tutup pracetak tipe tutup CU 50x10x120 cm), T = 10 ton
3	Saluran berbentuk U tipe 30.40.120.8 cm (dengan tutup grill besi)
4	Box Culvert 60/60/120 (Precast pabrikasi)

atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Om, Santhi, Santhi, Santhi, Om

PROGRES REPORT PENGAWASAN MINGGU 10 (13 NOVEMBER S.D 20 NOVEMBER 2023)

KEGIATAN ERKEGIATAN : Kegiatan Penataan Landscape Gedung Baru Rumah Sakit Riba Tahun Anggaran 2023 EKERJAAN : Pengawasan Pengadaan Jalan Khusus Penataan Landscape (Parkir) ALI PROYEK : Rp. 979.725.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu Rupiah) PELAKSANAAN : 90 (Sembilan Puluh Hari) INTRAKTOR : PT. MANIK BEKECAP KARYA TAN PENGAWAS : CV. MANAR JAYA	LAPORAN CUACA				KENDALA DALAM PEKERJAAN		SATUAN PEKERJAAN	
	TANGGAL	CERAH	MENYURG	HUJAN			NO	SUB PEKERJAAN
	14	√					3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
	15	√					3,1	APK
	16	√					a	Pembatas Area (Restricted Area)
	17	√						
	18	√					3,2	APD
19	√					a	Topi Pelindung (Safety Helmet)	
20	√					b	Pelindung pernafasan dan mulut (Masker, Masker Respirator)	

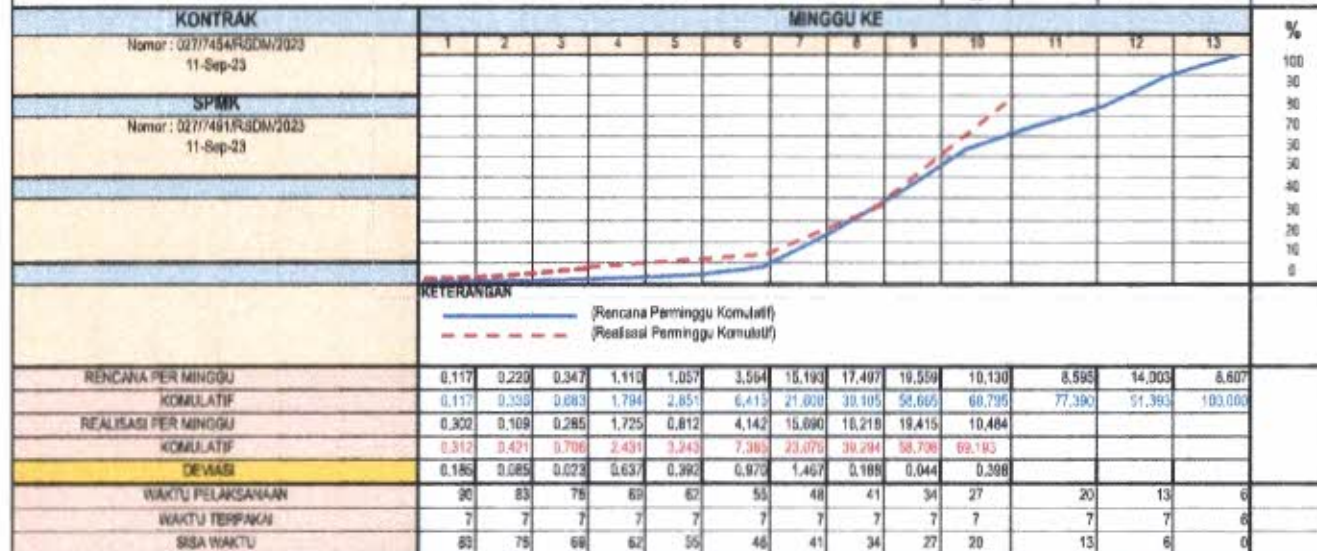


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RENCANA PER MINGGU	0,117	0,220	0,347	1,113	1,057	3,564	15,193	17,497	19,559	10,130	8,595	14,903	8,607
KOMULATIF	0,117	0,339	0,683	1,794	2,851	6,415	21,608	39,105	58,665	68,795	77,390	91,393	100,000
REALISASI PER MINGGU	0,302	0,109	0,285	1,725	0,812	4,142	15,690	16,218	19,415	10,484			
KOMULATIF	0,312	0,421	0,706	2,431	3,243	7,385	23,075	39,294	58,709	69,193			
DEVIASI	0,185	0,085	0,022	0,637	0,392	0,972	1,407	0,188	0,044	0,398			
WAKTU PELAKSANAAN	30	83	76	69	67	53	48	41	34	27	20	13	6
WAKTU TERPAKAI	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6
SISA WAKTU	83	75	69	62	59	46	41	34	27	20	13	6	0

TENAGA KERJA DI LAPANGAN PER MINGGU

NO	URAIAN	14	15	16	17	18	19	20
1	Peternakan	2	2	2	2	2	2	2
2	Ahi K3	1	1	1	1	1	1	1
3	Mandor	1	1	1	1	1	1	1
4	Kepala Tukang							
5	Tukang Batu							
6	Tukang Alumunium							
7	Tukang Listrik							
8	Tukang Plafond							
9	Pekerja	4	4	4	4	4	4	4
JUMLAH		8	8	8	8	8	8	8

KETERANGAN

1. Proses Aproval sudah berlangsung mohon setorkan buku Invoice pemesanan pekerjaan Saluran U-ditch
2. Konfirmasi Untuk Jadwal Kedatangan U-Ditch

DIBUAT OLEH
 KONSULTAN PENGAWAS
CV. MANAR JAYA

 I Dewa Noman Karyawan, ST
 Team Leader

DOKUMENTASI PROGRES





RSD MANGUSADA



CV. MANAR JAYA

Jl. Nuansa Hijau Utama III/10 Ubung Kaja Denpasar Utara 80116,
Telp./Fax: (0361) 412843, E-mail: amantajaya@yahoo.co.id

• NPWP: 02.079.796.5-901.000 • KTA: 11079490157/BL • NIK: 896.01.11.60223-8 • No. 081.744.96428

Om, Swastiastu

Berikut Penyampaian Informasi Progres

Pekerjaan :		DIVISI 5. PERKERASAAN
Minggu ke :	11	1 lapis Pondasi Agregat Kelas A
Tanggal :	21 NOVEMBER S.D 27 NOVEMBER 2023	
Rencana :	58.665	
Realisasi :	58.708	
Deviasi :	0.044	
Waktu Terpakai :	77	
Sisa Waktu :	13	

Lingkup Pekerjaan Pencapaian

	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
3.1	APK
a	Pembatas Area (Restricted Area)
3.2	APD
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)
b	Pelindung pernafasan dan mulut (Masker, Masker Respirator)
c	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)
d	Rompi keselamatan (Safety vest)
II	DIVISI 2. DRAINASE
1	Gellan untuk selokan drainase dan saluran air
2	Saluran berbentuk U tipe 50x60x120 cm (dengan tutup pracetak tipe tutup CU 50x10x120 cm), T = 10 ton
3	Saluran berbentuk U tipe 30.40.120.8 cm (dengan tutup grill besi)
4	Box Culvert 60/60/120 (Precast pabrikasi)

atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Om, Santhi, Santhi, Santhi, Om



RSD MANGUSADA



CV. MANAR JAYA

Jl. Nuansa Hijau Utama III/10 Ubung Kaja Denpasar Utara 80116,
Telp./Fax: (0361) 412843, E-mail: amantajaya@yahoo.co.id

• NPWP: 02.079.736.5.907.000 • NTA: 11070/P/0157/01 • NER: 750/01/11.000234 • Hp: 081 240 96428

Om, Swastiastu

Berikut Penyampaian Informasi Progres

Pekerjaan	:		DIVISI 5. PERKERASAAN
Minggu ke	:	12	1 lapis Pondasi Agregat Kelas A
Tanggal	:	28 NOVEMBER S.D 4 DESEMBER 2023	
Rencana	:	58.665	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL
Realisasi	:	58.708	1 Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi
Deviasi	:	0.044	2 Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi
Waktu Terpakai	:	84	3 Laston Lapis Aus (AC-WC)
Sisa Waktu	:	6	4 Laston Lapis Antara (AC-BC)

Lingkup Pekerjaan Pencapaian

	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
3.1	APK
a	Pembatas Area (Restricted Area)
3.2	APD
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)
b	Pelindung pernafasan dan mulut (Masker, Masker Respirator)
c	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)
d	Rompi keselamatan (Safety vest)
II	DIVISI 2. DRAINASE
1	Galian untuk selokan drainase dan saluran air
2	Saluran berbentuk U tipe 50x60x120 cm (dengan tutup pracetak tipe tutup CU 50x10x120 cm), T = 10 ton
3	Saluran berbentuk U tipe 30.40.120.8 cm (dengan tutup grill besi)
4	Box Culvert 60/60/120 (Precast pabrikasi)

atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih


Om, Santhi, Santhi, Santhi, Om

PROGRES REPORT PENGAWASAN MINGGU 12 (28 NOVEMBER S.D 4 DESEMBER 2023)

KEGIATAN	: Kegiatan Penataan Landscape Gedung Baru Rumah Sakit Rbu Tahun Anggaran 2023
PEKERJAAN	: Pengawasan Pempadatan Jalan Khusus, Penataan Landscape (Parkir)
BIAYA PROYEK	: Rp. 979.725.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu Rupiah)
PELAKSANAAN	: 90 (Sembilan Puluh Hari)
INSTRUKTOR	: PT. MANIK SEKECAP KARYA
TAN PENGAWAS	: CV. MANAR JAYA

LAPORAN CUACA			
TANGGAL	CERAH	MENDUNG	HUJAN
28	√		
29	√		
30	√		
1	√		
2	√		
3	√		
4	√		


KENDALA DALAM PEKERJAAN		SATUAN PEKERJAAN	
NO	DESKRIPSI	NO	SUB PEKERJAAN
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri		
3.1	APK		
a	Pembatas Area (Restricted Area)		
3.2	APD		
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)		
b	Pelindung pernafasan dan mulut (Masker, Masker Respirator)		
c	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)		
d	Rompi keselamatan (Safety vest)		
SOLUSI PERMASALAHAN		DIVISI 2. DRAINASE	
1.	Pemadatan Agregat Laki 3 Kali Pibro Pengalangan	1	Galian untuk selokan drainase dan saluran air
2.	Perekat - Pengikat dParasikan Terlebih dahulu	2	Saluran berbentuk U tipe 50x60x120 cm
3.	Ac BC - sesuai spak 0.6 di lapangan	3	Saluran berbentuk U tipe 30.40.120.8 cm (dengan tutup grill besi)
		4	Box Culvert 60/60/120 (Precast pabrikasi)
		DIVISI 5. PERKERASAAN	
		1. Lapis Pondasi Agregat kelas A	
		DIVISI 6. PERKERASAAN ASPAL	
		1. Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	
		2. Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	
		3. Lashon Lapis Atas (AC-WC)	
		4. Lashon Lapis Antara (AC-BC)	

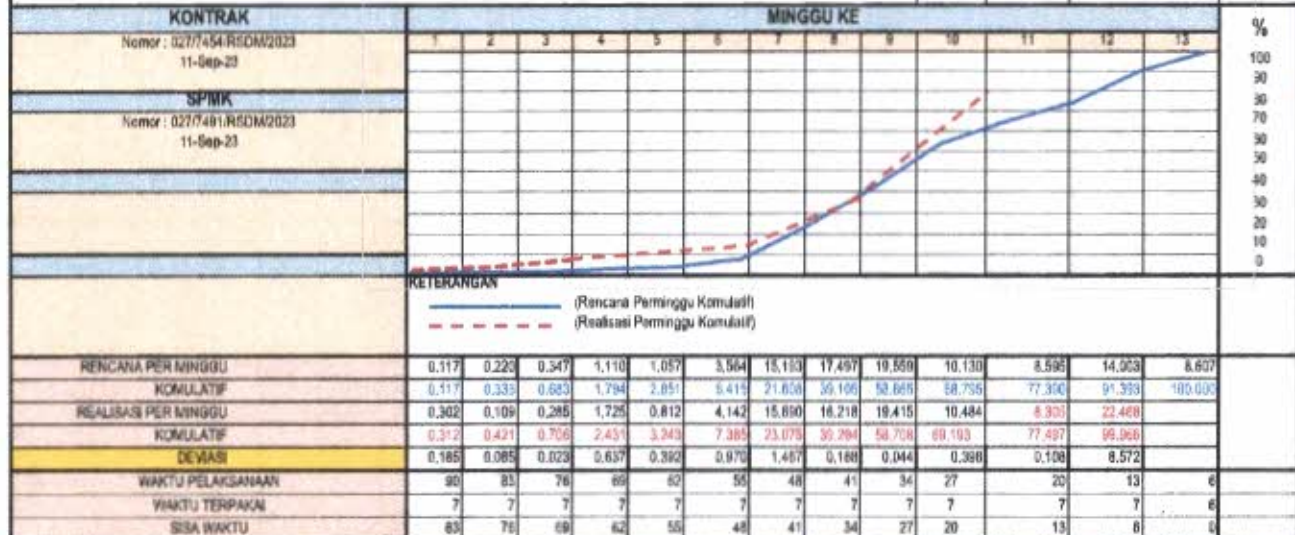

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RENCANA PER MINGGU	0.117	0.220	0.347	1.110	1.057	3.564	15.153	17.497	19.559	10.130	8.595	14.003	8.607
KUMULATIF	0.117	0.335	0.683	1.794	2.851	6.415	21.638	36.106	52.665	58.755	77.300	91.333	100.000
REALISASI PER MINGGU	0.302	0.109	0.285	1.225	0.812	4.142	15.890	18.218	19.415	10.484	8.301	22.468	
KUMULATIF	0.312	0.421	0.706	2.431	3.243	7.385	23.075	39.294	58.708	69.193	77.497	99.966	
DEVIASI	0.185	0.085	0.023	0.637	0.392	0.970	1.467	0.168	0.044	0.389	0.108	8.572	
WAKTU PELAKSANAAN	90	81	76	69	62	55	48	41	34	27	20	13	6
WAKTU TERPAKAI	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6
SISA WAKTU	83	74	69	62	55	48	41	34	27	20	13	6	6

NO	URAIAN	28	29	30	1	2	3	4
1	Pelaksana	2	2	2	2	2	2	2
2	Ani KS	1	1	1	1	1	1	1
3	Mandor	1	1	1	1	1	1	1
4	Kepala Tukang							
5	Tukang Batu							
6	Tukang Aluminium							
7	Tukang Listrik							
8	Tukang Plafond							
9	Pekerja	4	4	4	4	4	4	4
JUNJAH		6	6	6	6	6	6	6

KETERANGAN
 1. Proses Aproval sudah berlangsung mohon setorkan bukti Invoice pemesanan pekerjaan Saluran U-ditch
 2. Konfirmasi Untuk Jadwal Kedatangan U-Ditch

DIBUAT OLEH
 KONSULTAN PENGAWAS
CV. MANAR JAYA

I Dewa Nyoman Kalyana, ST
 Team Leader

DOKUMENTASI PROGRES





RSD MANGUSADA



CV. MANAR JAYA

Jl. Nuansa Hijau Utama III/10 Utung Kaya Denpasar Utara 80116,
Telp./Fax: (0361) 412843, E-mail: amritajaya@yahoo.co.id

• NPWP: 02.079.796.5.001.000 • ETA: 130704P/0107 DL • REK: 096.91.11.00023.0 • Hp: 081.246.98428

Om, Swastiastu

Berikut Penyampaian Informasi Progres

Pekerjaan	:	
Minggu ke	:	13
Tanggal	:	5 DESEMBER S.D 10 DESEMBER 2023
Rencana	:	100.000
Realisasi	:	100.000
Deviasi	:	-
Waktu Terpakai	:	90
Sisa Waktu	:	-

DIVISI 5. PERKERASAAN

1 lapis Pondasi Agregat Kelas A

DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL

- 1 Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi
- 2 Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi
- 3 laston Lapis Aus (AC-WC)
- 4 Laston Lapis Antara (AC-BC)

Lingkup Pekerjaan Pencapaian

	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
3.1	APK
a	Pembatas Area (Restricted Area)
3.2	APD
a	Topi Pelindung (Safety Helmet)
b	Pelindung pernafasan dan mulut (Masker, Masker Respirator)
c	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)
d	Rompi keselamatan (Safety vest)
II	DIVISI 2. DRAINASE
1	Galian untuk selokan drainase dan saluran air
2	Saluran berbentuk U tipe 50x60x120 cm (dengan tutup pracetak tipe tutup CU 50x10x120 cm), T = 10 ton
3	Saluran berbentuk U tipe 30.40.120.8 cm (dengan tutup grill besi)
4	Box Culvert 60/60/120 (Precast pabrikasi)

atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Om, Santhi, Santhi, Santhi, Om

PROGRES REPORT PENGAWASAN MINGGU 13 (5 DESEMBER S.D 10 DESEMBER 2023)


KEGIATAN
PEKERJAAN
AL PROYEK
PELAKSANAAN
TRAKTOR
TAN PENGAWAS

Kegiatan Penataan Landscape Gedung Baru Rumah Sakit Rbs Tahun Anggaran 2023
 Pengukuran Pengadaan Jalan Khusus, Penataan Landscape (Parkir)
 Rp. 979.725.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu Rupiah)
 80 (Sembilan Puluh Hari)
 PT. MANIK SEKECAP KARYA
 CV. MANAR JAYA

LAPORAN CUACA			
TANGGAL	CERAH	MENYING	HUJAN
5	√		
6	√		
7	√		
8	√		
9	√		
10	√		

KENDALA DALAM PEKERJAAN	

SATUAN PEKERJAAN	
NO	SUB PEKERJAAN
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
3.1	APK
4	Pembatas Area (Restricted Area)
3.2	APD
4	Topi Pelindung (Safety helmet)
b	Pelindung pernafasan dan mulut (Masker, Masker Respirator)
c	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)
d	Romp keselamatan (Safety vest)

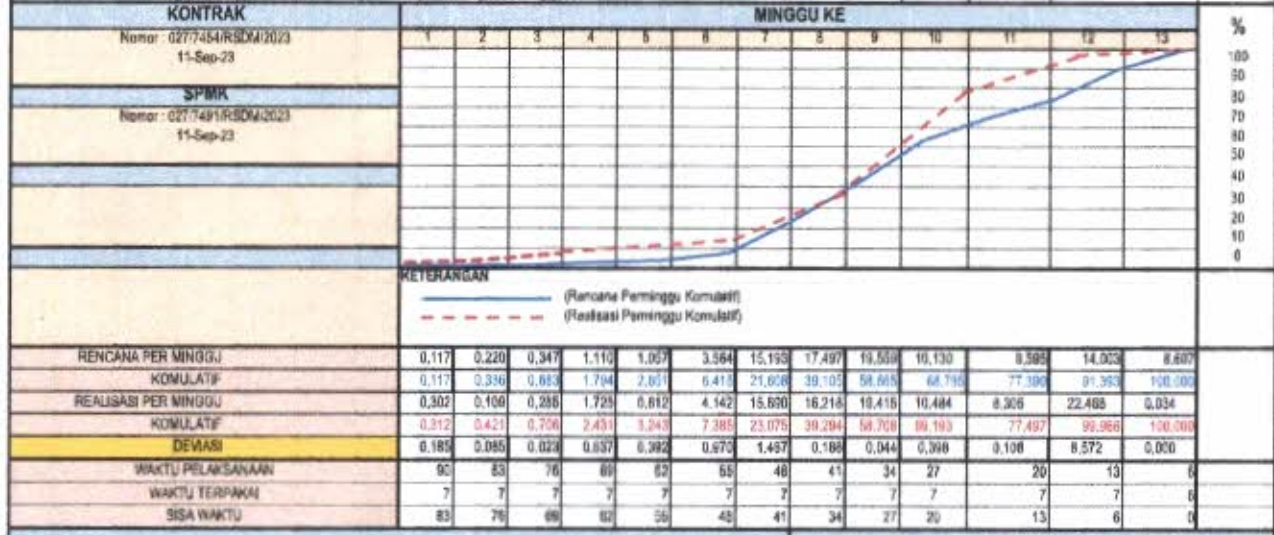

SOLUSI PERMASALAHAN

1. Proses Approval sudah berlangsung mohon serahkan bukti Invoice pemesanan pekerjaan Saluran U-dich

DIVISI 2. DRAINASE

- Galian untuk setoran drainase dan saluran air
- Saluran berbentuk U tipe 50x60x120 cm
- Saluran berbentuk U tipe 30.40.120.8 cm (dengan tutup grill besi)
- Box Culvert 60/60/120 (Precast pabrikasi)

DIVISI 5. PERKERASAAN

- Lapis Pondasi Agregat Kelas A

DIVISI 6. PERKERASAAN ASPAL

- Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi
- Lapis Perikat - Aspal Cair/Emulsi
- Laston Lapis Atas (AC-10C)
- Laston Lapis Antara (AC-8C)

NO	URAIAN	MINGGU KE													
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Peteloana	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
2	Ahli K3	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
3	Mandor	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
4	Kepala Tukang														
5	Tukang Batu														
6	Tukang Aluminium														
7	Tukang Listrik														
8	Tukang Plafond														
9	Pekerja	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
Jumlah		8	8	8	8	8	8	8	8	8					

KETERANGAN

- Proses Approval sudah berlangsung mohon serahkan bukti Invoice pemesanan pekerjaan Saluran U-dich
- Konfirmasi Untuk Jadwal Kedatangan U-Dich

DIBUAT OLEH
 KONSULTAN PENGAWAS
CV. MANAR JAYA

 I. Dedy Nyanan Karyawan, ST
 Team Leader

NO	URAIAN	4	5	6	7	8	9	10
1	Peteloana	2	2	2	2	2	2	2
2	Ahli K3	1	1	1	1	1	1	1
3	Mandor	1	1	1	1	1	1	1
4	Kepala Tukang							
5	Tukang Batu							
6	Tukang Aluminium							
7	Tukang Listrik							
8	Tukang Plafond							
9	Pekerja	4	4	4	4	4	4	4
Jumlah		8	8	8	8	8	8	8

DOKUMENTASI PROGRES

